

Monitoring Pekerjaan TI Tahun 2026 Berdasarkan Master Plan TI 2025-2029



TRIWULAN II 2026

Menyetujui,


Alfa Mahendar

Kepala Departemen Perencanaan dan Arsitektur TI

Portofolio Inisiatif Aplikasi TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Inisiatif Aplikasi TI

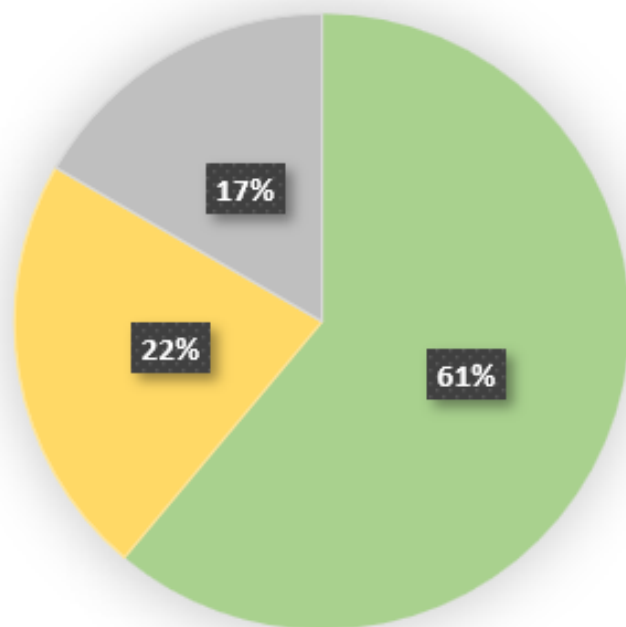

■ Selesai ■ In Progress ■ Belum Berjalan ■ Drop

**Terdapat Roadmap Pengembangan
18 Portofolio Inisiatif Aplikasi TI**

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des

Selesai (11 Inisiatif Aplikasi TI)

- A.2.1 Implementasi Data Hub / Virtualization Portal
- A.3.2 Implementasi Self Service Analytic Tools
- A.5.1 Implementasi Machine Learning pada Platform Big Data
- A.7.3 Peningkatan Kapabilitas SAP-HCM
- A.10.23 Peningkatan Kapabilitas Aplikasi SIDIA
- A.11.1 Perencanaan Penyediaan Data Catalog Platform berbasis Web Services /API
- A.11.3 Integrasi SAP HCM - Talent Management - LMS – Sertifikasi
- A.11.6 Optimalisasi penggunaan Software AG WebMethods
- A.11.8 Implementasi SSO secara menyeluruh di semua sistem aplikasi
- A.11.9 Optimalisasi penggunaan Collaboration Tool
- A.11.10 Optimalisasi penggunaan tool BPM secara berkelanjutan

In Progress (4 Inisiatif Aplikasi TI)

- A.4.1 Pengembangan use case untuk fungsional manajemen Operasional Produksi
- A.10.3 Pengembangan aplikasi SIQUMON untuk produksi NON UANG
- A.10.24 Peningkatan kapabilitas Aplikasi Nota Dinas Elektronik
- A.11.12 Optimalisasi tools EA

Drop (3 Inisiatif Aplikasi TI)

- A.7.2 Peningkatan Kapabilitas Aplikasi SAP QM (AI, ML & IOT)
- A.10.10 Pengembangan Aplikasi Cek Keaslian Materai
- A.11.2 Pengembangan API untuk integrasi SIDIA dengan DMS/IBM FileNet

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Data Hub / Virtualization Portal	A.2.1	Implementasi Data Hub / Virtualization Portal	Ruang Lingkup : - Implementasi Data Virtualization - Implementasi Data Catalog - Pengujian dan Validasi - Pelatihan dan Dokumentasi Prasyarat : - Implementasi Data Lake - Implementasi Data Ingestion & Preparation - Optimalisasi Integration Platform Peruri Luaran : - Sistem dan Platform - Integrasi dan Fungsionalitas - Dokumentasi dan Pelatihan Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	Data Lake, Data Ingestion, Platform Data Visualisasi	Selesai	

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Implementasi Data Analytic Tools	A.3.2	Implementasi Self Service Analytic Tools	Ruang Lingkup : - Analisis dan Perencanaan - Pengembangan dan Implementasi - Pengujian dan Validasi - Pelatihan dan Dokumentasi Prasyarat : - Implementasi Data Lake - Implementasi Data Ingestion & Preparation - Implementasi data virtualization / data catalog platform Luaran : - Sistem dan Infrastruktur - Panduan Pengguna (Data Analyst) - Dokumentasi dan Pelatihan Tahun: 2026 (Q1-Q3)	Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	Platform Data Visualisasi	Selesai	

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Peningkatan Predictive & Prespective Capabilities	A.4.1	Pengembangan use case untuk fungsional manajemen Operasional Produksi	Ruang Lingkup : - Definisi Use Case - Pengumpulan dan Integrasi Data - Pemodelan dan Analitik Prediktif dan Preskriptif - Pengujian dan Validasi - Implementasi Prasyarat : - Implementasi Data Lake - Implementasi Data Ingestion & Preparation - Peningkatan DataMart dengan penambahan sumber data dari Data Lake - Implementasi Self Service Analytic Tools - Pengembangan kapabilitas Laporan Analitikal ke Dashboard BI	Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	Predictive Maintenance SBU CS	In Progress	

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
			Luaran : - Dokumen Use Case - Arsitektur Data - Model Analitik - Dashboard Analitik - Laporan Implementasi Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Departemen Pengembangan Teknologi Informasi			

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Implementasi AI - ML	A.5.1	Implementasi Machine Learning pada Platform Big Data	Ruang Lingkup : - Analisis dan Perencanaan - Pengembangan Pipeline Data untuk Machine Learning - Pengembangan Model Machine Learning - Pelatihan dan Dokumentasi Prasyarat : - Implementasi Data Lake - Implementasi Data Ingestion & Preparation - Implementasi data virtualization / data catalog platform Luaran : - Infrastruktur dan Pipeline - Model Machine Learning - Dokumentasi dan Pelatihan Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	Artificial Intelligence Virtual Assistant	Selesai	

Legend



Selesai

In Progress



Belum Berjalan



Drop

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
SAP Improvement	A.7.2	Peningkatan Kapabilitas Aplikasi SAP QM (AI, ML & IOT)	Ruang Lingkup : - Peningkatan kelengkapan data pada SAP berdasarkan implementasi perangkat IOT - Integrasi data SAP dengan ekosistem big data analytic Peruri Prasyarat : - Optimalisasi integration platform Peruri Luaran : - Dokumentasi proyek pengembangan fitur tambahan - Dokumentasi teknis Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Departemen Pembelajaran dan Sertifikasi Profesi		Drop	Pelaksana dan program kerja tidak relevan

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
SAP Improvement	A.7.3	Peningkatan Kapabilitas SAP-HCM	Ruang Lingkup : • Penambahan atribut data yang terkait dengan siklus operasional HCM, terutama kebutuhan integrasi data • Membuat dokumentasi teknis hasil pengembangan • Update mekanisme dan kelengkapan data yang disinkronkan dengan data warehouse Prasyarat : - Luaran : • Dokumen manajemen proyek • Dokumen teknis pengembangan kapabilitas SAP Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Departemen SDM Operasional	Time Management	Selesai	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Pengembangan Kapabilitas Berkelanjutan Surrounding System	A.10.3	Pengembangan aplikasi SIQUMON untuk produksi NON UANG	Ruang Lingkup : - Identifikasi kebutuhan peta kebutuhan penggunaan EA tools untuk pengelolaan Enterprise Architecture - Mendefinisikan strategi dan tahapan untuk perluasan penggunaan EA Tool - Memastikan dukungan lisensi jika ada - Mengukur capaian pemanfaatan collaboration tool Prasyarat : - Luaran : - Strategi Implementasi - Laporan berkala terhadap capaian penggunaan aplikasi - Review terhadap laporan untuk perbaikan berkelanjutan Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Dep. Perencanaan dan Arsitektur TI	BizzDesign	In Progress	FGD pembahasan probis produk Digital dengan digital dan BPPM

Legend



Selesai

In Progress



Belum Berjalan



Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Pengembangan Kapabilitas Berkelanjutan Surrounding System	A.10.10	Pengembangan Aplikasi Cek Keaslian Meterai	Ruang Lingkup : - Pengembangan aplikasi baru untuk mendukung pemeriksaan keaslian Meterai tempel dan produk non uang lainnya untuk penggunaan internal PERURI - Deteksi gambar, menghitung jumlah gambar secara otomatis, menggunakan AI, untuk validasi/object detection menggunakan YOLO Prasyarat : - Optimalisasi Integration Platform Peruri Luaran : - Dokumentasi proyek pengembangan fitur tambahan - Dokumentasi teknis Tahun: 2026 (Q1-Q3)	Dept. Pengendalian Kualitas	Sistem Monitoring Meterai	Drop	Detail Sub program perlu di review kembali

Legend

Selesai

In Progress

Page 10 of 10

Belum Berjalan

11/11/2016

Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Pengembangan Kapabilitas Berkelanjutan Surrounding System	A.10.23	Peningkatan Kapabilitas Aplikasi SIDIA	Ruang Lingkup : - Pengembangan fungsional baru untuk Sistem Digital Arsip - Riwayat dokumen - Kemudahan pencarian indexing semua dokumen formal perusahaan - Pengembangan kapabilitas untuk menjadi bagian dari keterbukaan data perusahaan sesuai dengan Data Catalog Portal maupun bentuk lain virtualisasi data sehingga dapat dimanfaatkan untuk sumber data analytical Prasyarat : - Optimalisasi Integration Platform Peruri Luaran : - Dokumentasi proyek pengembangan fitur tambahan - Dokumentasi teknis Tahun: 2026 (Q1-Q3)	Sekretariat Perusahaan	Sistem Informasi Digital Arsip	Selesai	

Legend

Selesai

In Progress

Page 10 of 10

Belum Berjalan

11/11/2019

Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Pengembangan Kapabilitas Berkelanjutan Surrounding System	A.10.24	Peningkatan kapabilitas Aplikasi Nota Dinas Elektronik	Ruang Lingkup : - Integrasi Nota Dinas Elektronik dengan manajemen arsip digital terkait: ✓ Pengelolaan Penciptaan Arsip (Surat Masuk-Keluar) ✓ Pengelolaan Pemeliharaan Arsip ✓ Pengelolaan Pemusnahan Arsip Prasyarat : - Optimalisasi Integration Platform Peruri Luaran : - Dokumentasi proyek pengembangan fitur tambahan - Dokumentasi teknis Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	Nota Dinas Elektronik	In Progress	UAT Ruang Lingkup SPPD

Legend



Selesai

In Progress



Belum Berjalan



Drop

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Optimalisasi Platform Pendukung Aplikasi	A.11.1	Perencanaan Penyediaan Data Catalog Platform berbasis Web Services /API	Ruang Lingkup : - Inventarisasi Sumber Data - Desain Arsitektur Data Virtualization dan Data Catalog Prasyarat : - Luaran : - Dokumen perencanaan penyediaan Data Catalog dengan lanskap semua Subject Area Data Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Departemen Perencanaan dan Arsitektur Teknologi Informasi	- BizzDesign - Dokumen Business Glossary Uang Logam dan SDM (pilot project)	Selesai	- Data Architecture SBU CS, SBU HSS - Dokumen Business Glossary Uang Logam dan SDM - Dokumen Data Ownership

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Optimalisasi Platform Pendukung Aplikasi	A.11.2	Pengembangan API untuk integrasi SIDIA dengan DMS/IBM FileNet	Ruang Lingkup : - Pengembangan integrasi SIDIA yang mampu melakukan crawling data yang tersimpan di DMS / IBM FileNet untuk diindeks kan untuk kemudahan pencarian dari SIDIA - Integrasi dengan virtualisasi data Prasyarat : - Optimalisasi Integration Platform Peruri Luaran : - Dokumentasi proyek pengembangan fitur tambahan - Dokumentasi teknis Tahun: 2026 (Q1-Q3)	Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	Sistem Informasi Digital Arsip	Drop	Ruang lingkup perlu di review kembali

Legend

Selesai

In Progress

Page 10 of 10

Belum Berjalan

11/11/2016

Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Optimalisasi Platform Pendukung Aplikasi	A.11.3	Integrasi SAP HCM - Talent Management - LMS - Sertifikasi	Ruang Lingkup : - Pengembangan integrasi menyeluruh untuk siklus manajemen sumber daya manusia antara SAP HCM - Talent Management - LMS – Sertifikasi - Menyediakan keterbukaan data pada data virtualization / data catalog untuk pemenuhan kebutuhan data di Layer analitika Prasyarat : - Optimalisasi Integration Platform Peruri - Implementasi data virtualization / data catalog platform Luaran : - Dokumentasi proyek pengembangan fitur tambahan - Dokumentasi teknis Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	ITMS	Selesai	Ruang Lingkup perlu di review kembali (Drop LMS)

Legend	Selesai	In Progress	Belum Berjalan	Drop
---------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	------------------

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Optimalisasi Platform Pendukung Aplikasi	A.11.6	Optimalisasi penggunaan Software AG WebMethods	Ruang Lingkup : - Monitoring optimalisasi utilisasi - Optimalisasi kemampuan WebMethods - Kinerja & Scalability Prasyarat : - Luaran : - Dokumentasi pemantauan dan optimalisasi pemanfaatan AG Web Methods Tahun: 2026 (Q1-Q4)	Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	Node endpoint traffic execution and resource orchestrator (NETERO)	Selesai	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Optimalisasi Platform Pendukung Aplikasi	A.11.8	Implementasi SSO secara menyeluruh di semua sistem aplikasi	Ruang Lingkup : - Assesmen Potensi dan Tahapan Implementasi SSO - Optimalisasi Solusi SSO yang sudah terimplementasikan - Integrasi Teknis dengan platform lain yang terkait seperti manajemen identitas dan akses (identitiy access management – IAM) Prasyarat : - Luaran : - Dokumentasi implementasi SSO pada sistem aplikasi - Pemantauan dan evaluasi terkait implementasi SSO secara bertahap Tahun: 2026 (Q1-Q4)	Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	Authentication and Verification (AVA)	Selesai	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Optimalisasi Platform Pendukung Aplikasi	A.11.9	Optimalisasi penggunaan Collaboration Tool	Ruang Lingkup : - Identifikasi kebutuhan peta kebutuhan penggunaan collaboration tool - Mendefinisikan strategi dan tahapan untuk perluasan penggunaan Collaboration Tool - Memastikan dukungan lisensi jika ada - Mengukur capaian pemanfaatan collaboration tool Prasyarat : - Luaran : - Strategi Implementasi - Laporan berkala terhadap capaian penggunaan aplikasi - Review terhadap laporan untuk perbaikan berkelanjutan Tahun: 2026 (Q1-Q3)	Semua unit kerja	Microsoft 365	Selesai	Cek Pelaksana

Legend

Selesai

In Progress

Page 10 of 10

Belum Berjalan

11/11/2019

Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Optimalisasi Platform Pendukung Aplikasi	A.11.10	Optimalisasi penggunaan tool BPM secara berkelanjutan	Ruang Lingkup : - Identifikasi kebutuhan peta kebutuhan penggunaan BPM tools untuk pengelolaan pendokumentasian proses bisnis - Mendefinisikan strategi dan tahapan untuk perluasan penggunaan BPM Tool - Memastikan dukungan lisensi jika ada - Mengukur capaian pemanfaatan collaboration tool Sosialisasi penggunaan tools BPM Prasyarat : - Luaran : - Strategi Implementasi - Laporan berkala terhadap capaian penggunaan aplikasi - Review terhadap laporan untuk perbaikan berkelanjutan Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Semua unit kerja Dept. Operasional TI	QPR	Selesai	Sudah selesai dilakukan upgrade OS dan version QPR

Legend



Selesai



In Progress



Belum Berjalan



Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF APLIKASI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)


Persentase
Project Selesai

61%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Aplikasi	Status	Keterangan
Optimalisasi Platform Pendukung Aplikasi	A.11.12	Optimalisasi tools EA	Ruang Lingkup : - Identifikasi kebutuhan peta kebutuhan penggunaan EA tools untuk pengelolaan Enterprise Architecture - Mendefinisikan strategi dan tahapan untuk perluasan penggunaan EA Tool - Memastikan dukungan lisensi jika ada - Mengukur capaian pemanfaatan collaboration tool Prasyarat : - Luaran : - Strategi Implementasi - Laporan berkala terhadap capaian penggunaan aplikasi - Review terhadap laporan untuk perbaikan berkelanjutan Tahun: 2026 (Q1-Q2)	Dep. Perencanaan dan Arsitektur TI	Bizz Design	In Progress	FGD pembahasan probis produk Digital dengan Digital dan BPPM

Portofolio Inisiatif Teknologi TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

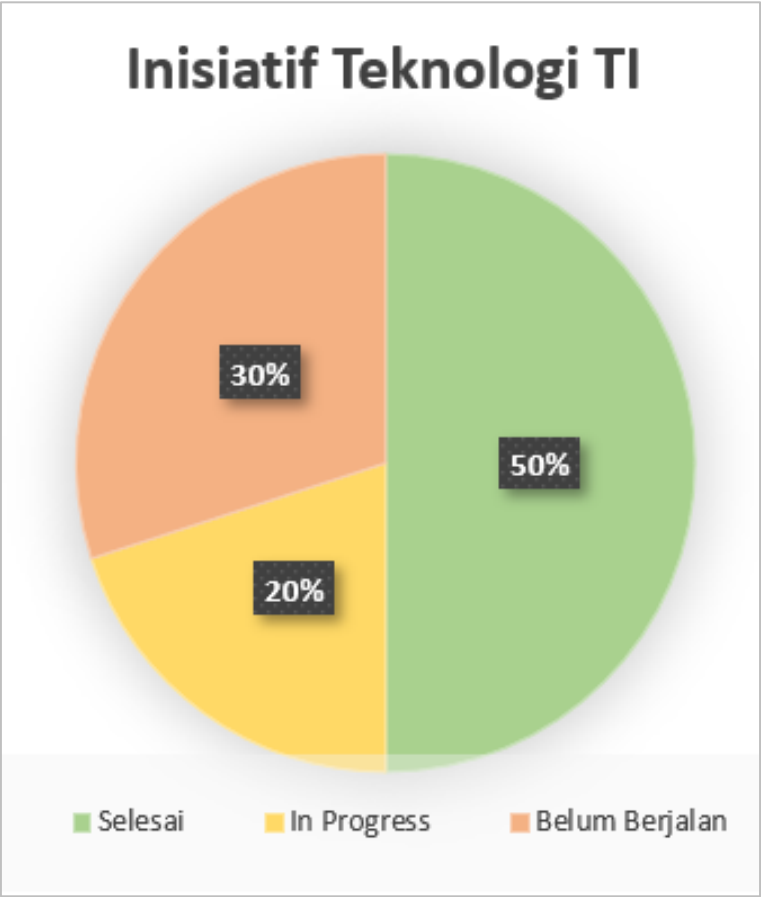

Terdapat Roadmap Pengembangan
10 Portofolio Inisiatif Teknologi TI

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des

Selesai (5 Inisiatif Teknologi TI)
- B.1.1.1 Peningkatan kemampuan komputasi dan kapasitas Storage pengolahan data terkait Data warehouse dan Big Data - B.1.1.2 Peningkatan kemampuan komputasi dan kapasitas Storage pengolahan data terkait Artificial intelligence dan Machine learning - B.1.2.1 Perluasan Implementasi dan integrasi interface IOT dan MES (Manufacturing Execution System) - B.1.3.4 Implementasi tools / teknologi yang mampu melakukan orchestration switch over secara otomatis seperti Application load balancer (ALB) - B.1.5.12 Penerapan Security Information and Event Management (SIEM)

In Progress (2 Inisiatif Teknologi TI)
- B.1.5.11 Penguatan penerapan Vulnerability and Patch Management - B.1.5.16 Implementasi Zero Trust access

Belum Berjalan (3 Inisiatif Teknologi TI)
- B.1.5.3 Penerapan Data Masking and Encryption pada seluruh Data yang diklasifikasikan data sensitive - B.1.5.5 Implementasi Data Loss Prevention - B.1.5.13 Implementasi Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Platform Big Data dan Data Warehouse	B.1.1.1	Peningkatan kemampuan komputasi dan kapasitas Storage pengolahan data terkait Data warehouse dan Big Data	Ruang Lingkup: Merupakan seluruh aktivitas teknis dan strategis yang diperlukan untuk memastikan sistem dapat menangani beban data yang semakin besar dan kompleks secara efisien. Prasyarat : - Identifikasi jenis data yang akan disimpan, termasuk data terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur - Mengidentifikasi dan memetakan berbagai sumber data yang akan diintegrasikan ke dalam sistem penyimpanan dan pemrosesan - Menilai solusi teknologi yang sesuai untuk penyimpanan data besar dan pemrosesan data - Menyiapkan alur ETL (Extract, Transform, Load) untuk memindahkan data ke data warehouse atau platform big data - Estimasi volume data yang akan disimpan dalam jangka waktu tertentu, misalnya: pertahun	Departemen Perencanaan dan Arsitektur TI Departemen Operasional TI - Departemen Pengembangan TI	Big Data Platform	Selesai	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Mengidentifikasi kebutuhan komputasi yang dibutuhkan untuk analisis data misalnya: CPU, GPU, memori, dan Storage - Mengevaluasi infrastruktur penyimpanan dan komputasi yang ada, apakah sudah mampu menangani volume dan jenis data yang akan diproses Luaran : - Desain arsitektur penyimpanan yang mencakup data warehouse, platform big data, serta integrasi antar komponen - Spesifikasi kapasitas penyimpanan dan komputasi yang diperlukan untuk mendukung pemrosesan dan analisis data - Data dari berbagai sumber berhasil dipindahkan dan disusun dengan benar dalam data warehouse atau platform big data				

Legend

Selesai

In Progress

Belum Berjalan

Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			• Proses ETL berfungsi dengan baik dan data dapat diproses sesuai dengan kebutuhan analitik Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Platform Big Data dan Data Warehouse	B.1.1.2	Peningkatan kemampuan komputasi dan kapasitas Storage pengolahan data terkait Artificial intelligence dan Machine learning	Ruang Lingkup : - Merupakan aktivitas teknis dan operasional untuk mendukung pengembangan, pelatihan, dan penerapan model AI/ML secara efisien - Kebutuhan akan Peningkatan kemampuan komputasi berperforma tinggi seperti teknologi Graphics Processing Units (GPU) dan Tensor Processing Units (TPU) untuk mempercepat pemrosesan model AI dan ML Prasyarat : - Menilai dan mengidentifikasi sumber data yang relevan dari IIOT yang berupa sensor data, log data, dan lain sebagainya serta data MES pada data produksi, status mesin yang akan digunakan untuk analisis	Departemen Perencanaan dan Arsitektur TI Departemen Operasional TI - Departemen Pengembangan TI	Big Data Platform	Selesai	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Mengidentifikasi apakah data tersebut terstruktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur, dan memahami karakteristik masing-masing data - Menentukan jenis penyimpanan yang tepat untuk menangani volume besar data mentah dari IIOT dan MES - Menentukan model AI/ML yang akan digunakan untuk prediksi pemeliharaan misalnya, algoritma prediktif seperti klasifikasi atau regresi - Mengidentifikasi kemampuan komputasi yang dibutuhkan untuk memproses volume data besar dan kompleks dan Menilai kebutuhan GPU atau TPU untuk mempercepat pemrosesan AI/ML				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			Luaran : - Laporan yang merinci data yang diperlukan baik data terstruktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur, serta kapasitas komputasi yang dibutuhkan untuk memproses data dalam konteks AI dan ML - Deskripsi model AI/ML yang akan digunakan dalam predictive maintenance, serta teknik analitik yang akan diterapkan pada data IIOT dan MES - Rencana arsitektur yang mencakup jenis penyimpanan data, serta sistem komputasi dengan dukungan GPU/TPU untuk mempercepat analisis AI/ML - Diagram yang menggambarkan integrasi antar komponen penyimpanan, komputasi, dan data sources (IIOT, MES)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Menyediakan perangkat keras server , GPU, TPU dan Storage - Menyediakan perangkat lunak dalam platform big data, dan framework AI/ML yang diperlukan - Data dari IIOT dan MES dapat diakses dan diproses dengan aman menggunakan sistem yang telah diimplementasikan Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Perluasan Implementasi dan Integrasi IoT	B.1.2.1	Perluasan Implementasi dan integrasi interface IOT dan MES (Manufacturing Execution System)	Ruang Lingkup : - Seluruh aspek teknis dan operasional yang diperlukan untuk mengintegrasikan perangkat IIoT dengan MES, memperluas fungsionalitas sistem, dan memastikan data dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan Prasyarat : - Mengidentifikasi perangkat IIoT yang sudah terpasang (sensor, aktuator, edge devices) - Mengevaluasi sistem MES yang sudah digunakan seperti kemampuan integrasi atau skalabilitas - Menyelaraskan protokol komunikasi antara IIoT dan MES	Departemen Perencanaan dan Arsitektur TI Departemen Operasional TI - Departemen Pengembangan TI	MES UGAM	Selesai	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Jaringan yang stabil dengan bandwidth yang cukup untuk mendukung konektivitas IIoT Luaran : - Sistem yang dapat mengalirkan data secara real-time antara perangkat IIoT dan MES - Modul yang mampu memanfaatkan data IIoT untuk analitik, prediksi, atau pengendalian proses - Dokumentasi teknis yang mencakup konfigurasi sistem, protokol komunikasi, dan proses operasional - Setelah proses implementasi dilakukan review untuk memastikan keberhasilan implementasi serta memastikan sistem yang dikembangkan optimal, aman, dan sesuai tujuan bisnis Tahun: 2026 (Q1-Q2)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Performa dan Interkoneksi Jaringan	B.1.3.4	Implementasi tools / teknologi yang mampu melakukan orchestration switch over secara otomatis seperti Application load balancer (ALB)	Ruang Lingkup : - Implementasi tools atau teknologi yang mampu melakukan orchestration switch over secara otomatis seperti Application load balancer (ALB) - Berdasarkan dokumen BCP/DRP, bahwa RPO (Recovery Point Objective) yang disyaratkan untuk server virtualisasi adalah sebesar 1 jam. Untuk mencapai target tersebut sudah dilakukan replikasi DC - DRC setiap 1 jam sekali - Tetapi pada saat kondisi darurat bencana yang memerlukan switch over aplikasi dari DC ke DRC masih memerlukan langkah - langkah secara manual. Untuk itu diperlukan tools atau teknologi yang mampu melakukan orchestration switch over secara otomatis	Departemen Operasional TI	GTM (Global Traffic Management)	Selesai	Teknologi <i>load balancing</i> pada aplikasi web dengan fitur <i>failover</i> secara otomatis. Implementasi pada aplikasi web, meliputi : - Portal/NDE - Employee Self Service - SSO (Single-Sign On) - Eproc - E-Invoice - Website Peruri

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			Prasyarat : - Mengidentifikasi aplikasi kritikal yang perlu dipindahkan dari DC ke DRC untuk menjaga kelangsungan operasional - Menilai infrastruktur yang ada, termasuk jenis aplikasi yang dijalankan, serta komponen yang perlu dipindahkan saat terjadinya switch over - Menilai berbagai solusi Application Load balancer (ALB) dengan melakukan POC untuk memastikan kemampuan dalam mengelola orkestrasi dan pengalihan beban aplikasi - Memastikan bahwa solusi ALB yang dipilih dapat diintegrasikan dengan infrastruktur virtualisasi yang ada di DC dan DRC, serta mendukung replikasi data yang ada				

Legend	Selesai	In Progress	Belum Berjalan	Drop
--------	---------------------	-------------------------	----------------------------	------------------

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk implementasi ALB tersedia dan kompatibel dengan arsitektur yang ada Luaran : - Dokumentasi tentang aplikasi dan sistem yang perlu di-switch over otomatis, serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai RPO yang diinginkan - Desain solusi orkestrasi switch over dengan menggunakan Application Load balancer (ALB), untuk mengotomatiskan proses pemindahan aplikasi secara real-time - Pemilihan dan pengadaan teknologi ALB yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknis				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Rencana implementasi yang meliputi tahap pengadaan, integrasi, dan konfigurasi ALB - Sistem orkestrasi yang dapat melakukan pengalihan trafik aplikasi dari DC ke DRC secara otomatis dalam waktu yang sangat singkat - Dokumentasi lengkap mengenai konfigurasi load balancer dan pengaturan orkestrasi yang telah diterapkan Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Cybersecurity Tools	B.1.5.3	Penerapan Data Masking and Encryption pada seluruh Data yang diklasifikasikan data sensitive	Ruang Lingkup : - Implementasi Penerapan Data Masking and Encryption pada seluruh Data yang diklasifikasikan data sensitive oleh PERURI Prasyarat : - Mengidentifikasi data yang perlu dilindungi, seperti data pribadi (PII) informasi keuangan, dan data sensitive lainnya. - Menentukan kriteria dan kebijakan untuk mengklasifikasikan data sensitif serta merumuskan standar pengelolaan data sesuai dengan regulasi yang berlaku. - Menilai berbagai teknologi dan solusi data masking dan enkripsi yang dapat digunakan untuk melindungi data sensitive - Memastikan solusi yang dipilih dapat menangani volume data sensitif yang besar dengan dampak minimal pada kinerja aplikasi	- Departemen Perencanaan TI - Departemen Operasional TI - Koordinator Keamanan TI		Belum Berjalan	Harsis : Perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan Koordinator Keamanan TI Keamanan TI : Diperlukan koordinasi dengan Koord IT Governance terkait identifikasi data yang perlu dilindungi pada laporan Data Gov. Diperlukan windows shopping terkait tools Static Data Masking dan Dynamic Data Masking

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Memastikan solusi yang dipilih memenuhi standar keamanan dan kepatuhan industri - Merancang arsitektur sistem yang mengintegrasikan solusi data masking dan enkripsi ke dalam aplikasi dan basis data yang mengelola data sensitive - Menentukan bagaimana data akan dimasking atau dienkrpsi dalam setiap tahap pengolahan data, baik saat penyimpanan (data at rest), transmisi (data in transit), dan pemrosesan (data in use) - Menentukan siapa yang memiliki akses ke data sensitif yang tidak dimasking atau tidak dienkrpsi serta siapa yang dapat mendekripsi data tersebut - Melakukan pengujian awal untuk memastikan bahwa data dimasking dan dienkrpsi dengan benar dan dapat didekripsi dengan tepat saat diperlukan				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			Luaran : - Daftar data sensitif yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan pedoman klasifikasi data PERURI. - Laporan yang mencakup analisis dan evaluasi terhadap berbagai solusi, serta rekomendasi teknologi yang dipilih. - Desain teknis dan arsitektur sistem yang mencakup bagaimana data masking dan enkripsi akan diterapkan. - Laporan yang merinci langkah-langkah implementasi, konfigurasi alat, serta pengujian yang dilakukan Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Cybersecurity Tools	B.1.5.5	Implementasi Data Loss Prevention	Ruang Lingkup : - Implementasi Data Loss Prevention untuk melindungi data sensitive dari kehilangan atau kebocoran data - DLP mencakup penggunaan kebijakan, perangkat lunak, dan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah transmisi data sensitif yang tidak sah Prasyarat : - Mengidentifikasi data yang perlu dilindungi seperti data pribadi (PII) informasi keuangan, dan data sensitive lainnya - Menentukan kriteria dan kebijakan untuk mengklasifikasikan data sensitif serta merumuskan standar pengelolaan data sesuai dengan regulasi yang berlaku	- Departemen Perencanaan TI - Departemen Operasional TI - Koordinator Keamanan TI		Belum Berjalan	Seksi Helpdesk TI : Dalam tahap mempelajari tools yang berkaitan dengan DLP dan melakukan Observasi fit & Gap feature pre Impelementasi Memerlukan Koordinasi dengan koordinator IT GOV Terkait pedoman klasifikasi data

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Menetapkan kebijakan yang jelas mengenai data sensitif dan bagaimana data ini harus dikelola - Melakukan penilaian bagaimana data sensitif diproses, disimpan, dan dibagikan di seluruh organisasi, serta potensi risiko kebocoran data - Menentukan siapa yang dapat mengakses dan memindahkan data sensitif serta menetapkan batasan akses untuk mencegah kebocoran data - Mengevaluasi berbagai solusi DLP baik berbasis perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat memonitor, mendeteksi, dan mencegah kebocoran data sensitive - Memastikan bahwa solusi DLP yang dipilih dapat terintegrasi dengan infrastruktur TI yang ada				Keamanan TI : Akan berkoordinasi dengan Koordianator IT Governance terkait hasil data governance dan Departemen Operasional terkait implementasi

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Menguji implementasi DLP untuk memastikan bahwa sistem dapat secara efektif mendeteksi dan mencegah pelanggaran kebijakan tanpa mengganggu operasi bisnis Luaran : - Daftar data sensitif yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan pedoman klasifikasi data PERURI - Daftar jenis dan lokasi data sensitif yang perlu dilindungi, termasuk lokasi penyimpanan data dan alur pengolahannya - Prosedur yang jelas tentang siapa yang berwenang mengakses data sensitif serta batasan yang diterapkan pada akses tersebut - Laporan hasil evaluasi dan pemilihan solusi DLP yang sesuai untuk organisasi				

Legend



Selesai



In Progress



Belum Berjalan



Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			Laporan hasil uji coba respons terhadap insiden untuk memastikan bahwa organisasi dapat merespons kebocoran data dengan cepat dan efektif Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Cybersecurity Tools	B.1.5.11	Penguatan penerapan Vulnerability and Patch Management	Ruang Lingkup : - Penguatan Penerapan Vulnerability and Patch Management pada Operating System yang out of date Prasyarat : - Menyusun daftar seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan, termasuk sistem operasi yang digunakan pada setiap perangkat - Mengidentifikasi kebijakan dan jadwal pemeliharaan untuk setiap sistem operasi yang digunakan dalam infrastruktur TI - Menyusun daftar kerentanannya untuk sistem operasi yang sudah kedaluwarsa - Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk patch management yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil saat mengelola patch untuk sistem yang kedaluwarsa - Menyusun rencana patching berdasarkan prioritas yang sudah diidentifikasi pada aktivitas sebelumnya, termasuk waktu yang tepat untuk melakukannya tanpa mengganggu operasional bisnis	- Departemen Perencanaan TI - Departemen Operasional TI - Koordinator Keamanan TI	Tenable One	In Progress	Harsis : Sudah melakukan proses patching dengan remediiasi maksimal (tanpa upgrade teknologi) sesuai dengan hasil temuan yang disampaikan oleh Koordinator Keamanan TI Infra TI : Upgrade berkala perangkat Server dan Network (Nutanix, Fortigate, SD-WAN)

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Menggunakan lingkungan staging atau pengujian untuk memastikan patch tidak merusak fungsionalitas atau kinerja aplikasi yang ada sebelum diterapkan pada sistem produksi - Melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi dan layanan yang bergantung pada sistem operasi tetap berfungsi setelah penerapan patch - Menetapkan alat monitoring dan pelaporan patching untuk memberi tahu tim keamanan TI mengenai status patching secara real-time Luaran : - Daftar lengkap semua sistem operasi yang digunakan, beserta versinya, yang menunjukkan status kedaluwarsa atau perlu pembaruan - Laporan terkait perangkat atau server yang membutuhkan pembaruan patch. - Laporan hasil pengujian kerentanannya yang mengidentifikasi potensi risiko pada sistem yang out of date. Serta Penilaian kerentanannya yang mengklasifikasikan tingkat kerentanan dan prioritas pembaruan				Keamanan TI : - Update inventory data Asset Vulnerability Assesment - Montly Report Vulnerability All Asset - Montly Report Vulnerability Public Asset - Remediation Vulnerability dengan tim Dep Ops & Dep Bang

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Jadwal yang disepakati untuk penerapan patch dengan meminimalkan gangguan terhadap operasi dan pengguna akhir - Verifikasi bahwa patch telah berhasil diterapkan tanpa merusak sistem atau aplikasi yang berjalan - Laporan pengujian yang memastikan bahwa patch telah diterapkan dengan benar dan tidak menyebabkan masalah fungsional - Melakukan evaluasi dan pembaruan prosedur dan kebijakan patch management secara berkala untuk menyesuaikan dengan ancaman keamanan terbaru dan teknologi yang berkembang Tahun: 2026 (Q2-Q3)		XDR & Desktop Management		Helpdesk TI : Vulnerability berjalan secara otomatis menggunakan tools XDR dan melakukan patch melalui Desktop Management

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Cybersecurity Tools	B.1.5.12	Penerapan Security Information and Event Management (SIEM)	Ruang Lingkup : - Penerapan Security Information and Event Management (SIEM) untuk mendeteksi ancaman melalui analisis data secara real-time sehingga memungkinkan organisasi untuk merespons insiden lebih cepat Prasyarat : - Pengumpulan informasi mengenai infrastruktur TI saat ini , termasuk perangkat jaringan, server , aplikasi, dan endpoint yang perlu dimonitor - Menilai berbagai solusi SIEM dengan melakukan POC dengan penyedia serta melakukan penilaian kebutuhan kapasitas dan skalabilitas alat SIEM, berdasarkan volume data log yang akan dikelola - Identifikasi semua sumber data yang relevan untuk dimasukkan dalam SIEM, seperti log firewall, perangkat jaringan, server , aplikasi, database, dan endpoint	- Departemen Perencanaan TI - Departemen Operasional TI - Koordinator Keamanan TI	ELASTIC	Selesai	Kemanan TI : Evaluasi Data Ingestion, Personalize dashboard security Next Action MSSP SOC Harsis : Perlu adanya peningkatan kolaborasi untuk integrasi data source dari environment terkait Dashboard SIEM dikelola dan dilakukan monitoring oleh Seksi Operation Security

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Menyusun koneksi antara sistem SIEM dan sumber data yang berbeda menggunakan agen atau metode pengumpulan log yang didukung - Menentukan jenis ancaman yang perlu dideteksi, seperti malware, phishing, brute force attacks, data exfiltration - Menyusun use case dan playbooks untuk insiden keamanan yang sering terjadi - Menyesuaikan alerting dan notifications untuk memastikan pemberitahuan yang relevan ketika ancaman terdeteksi - Menyusun prosedur tanggap insiden yang jelas yang mencakup langkahlangkah mitigasi dan respons terhadap insiden yang terdeteksi oleh SIEM				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			Luaran : - Daftar perangkat dan sumber data yang akan diintegrasikan dengan SIEM - Solusi SIEM yang dipilih dan disetujui oleh organisasi - Hasil identifikasi sumber data yang terintegrasi dengan SIEM serta melakukan formating dan pengiriman log yang standar dari perangkat yang dianalisis ke SIEM - Sistem peringatan yang berfungsi dengan baik, memberikan informasi yang cukup untuk analisis lebih lanjut - Melakukan pengujian sistem SIEM untuk memastikan bahwa data yang diterima dapat diproses, dianalisis, dan dikorelasikan dengan benar - Melakukan simulasi serangan atau insiden untuk menguji apakah SIEM dapat mendeteksi dan merespons dengan tepat Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Cybersecurity Tools	B.1.5.13	Implementasi Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)	Ruang Lingkup : - Implemetasi Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) - Implementasi SOAR dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasi keamanan, mengurangi waktu respons terhadap insiden dimana dapat mengintegrasikan berbagai alat dan proses keamanan untuk otomatisasi dan menginformasikan respons terhadap insiden keamanan Prasyarat : - Penilaian kebutuhan organisasi terkait automasi dan orkestrasi proses keamanan - Melakukan Identifikasi skenario insiden yang sering terjadi dan area yang dapat diotomatisasi - Penilaian berbagai solusi SOAR yang tersedia di pasar dengan melakukan Proof Of Concept terhadap vendor - Melakukan Identifikasi alat-alat yang akan diintegrasikan dengan SOAR, seperti SIEM, IDS/IPS, firewall, endpoint detection and response (EDR), dsb	- Departemen Perencanaan TI - Departemen Operasional TI - Koordinator Keamanan TI		Belum Berjalan	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			Luaran : - Solusi SOAR yang dipilih dan disetujui - Pengaturan integrasi untuk aliran data yang tepat antara sistem SOAR dan alat yang dihubungkan - Melakukan verifikasi apakah data yang dikirim dan diterima oleh SOAR kompatibel dengan format yang diterima oleh platform SOAR - Penyesuaian alur kerja untuk memastikan automasi dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kebijakan organisasi - Verifikasi bahwa alur kerja dan playbooks berfungsi dengan baik melalui pengujian - Penentuan jenis insiden yang membutuhkan pemberitahuan segera kepada tim keamanan - Konfigurasi alur pemberitahuan otomatis misalnya melalui sistem tiket untuk memastikan komunikasi yang efisien - Pengujian alur kerja, playbooks dan automasi respons di lingkungan staging atau uji coba untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Uji coba insiden simulasi untuk menguji respon dan pemberitahuan yang dilakukan oleh SOAR - Sistem SOAR yang diterapkan di lingkungan produksi dan siap untuk digunakan dalam respons insiden - Pemantauan real-time terhadap aktivitas keamanan dan respons terhadap insiden yang terdeteksi - Laporan pemantauan yang menunjukkan efektivitas SOAR dalam mengurangi waktu respons dan meningkatkan efisiensi Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Cybersecurity Tools	B.1.5.16	Implementasi Zero Trust access	Ruang Lingkup : - Implementasi Zero Trust access dimana menekankan bahwa semua akses ke sumber daya, baik itu jaringan, aplikasi, atau data, harus divalidasi sebelum diberikan, tanpa menganggap kepercayaan berdasarkan lokasi atau status jaringan Prasyarat : - Melakukan Identifikasi sumber daya kritikal yang perlu dilindungi - Menyusun peta alur akses pengguna dan perangkat yang akan diimplementasikan dalam model Zero Trust - Penilaian alat dan solusi Zero Trust dengan melakukan POC - Menentukan teknologi otentikasi multifaktor (MFA), Identity and Access Management (IAM), Network Segmentation, dan Micro-Segmentation yang akan digunakan dalam arsitektur Zero Trust	- Departemen Perencanaan TI - Departemen Operasional TI - Koordinator Keamanan TI	- Tailor made development (MFA & IAM) - Identity Provider : Active Directory - Identity Access Management : Keycloak - ZTA	In Progress	Harsis : sudah implementasi pilot project backend portal (manajemen konten) untuk MFA dan authwise sebagai IAM Helpdesk TI : Sudah tersedia server AD dengan Sistem Operasi baru yang mendapat dukungan teknis dari Principal

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)


Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			Luaran : - Pemilihan perangkat Zero Trust sesuai dengan kebutuhan organisasi - Menyusun arsitektur Zero Trust yang meliputi berbagai komponen, seperti identitas pengguna, perangkat, aplikasi, dan data yang akan diakses - Penyusunan protokol akses dan otentikasi untuk setiap titik akses, termasuk penggunaan MFA dan single sign-on (SSO) - Penentuan micro-segmentation untuk membatasi akses berdasarkan kebijakan keamanan yang ditentukan misalnya, membatasi komunikasi antar aplikasi yang tidak terkait. - Pengujian fungsi autentikasi dan otorisasi untuk memastikan bahwa proses Zero Trust berjalan sesuai yang diinginkan misalnya, setiap permintaan akses harus melewati autentikasi, otorisasi, dan pemantauan - Mengintegrasikan alat SIEM untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai titik akses Tahun: 2026 (Q1-Q4)				Keamanan TI : Design Architecture sudah dibuat, Phase 1 – 50% : Identity Provider (Active Directory) kolaborasi dengan seksi helpdesk untuk toolsnya Phase 2 – 20% : Integrasi dengan IAM Keycloak, kolaborasi dengan departemen pengembangan Phase 3 – 0% : Network Segmentation (ZTA) kolaborasi dengan seksi Infrastruktur

Portofolio Inisiatif Teknologi TI dan Digital

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

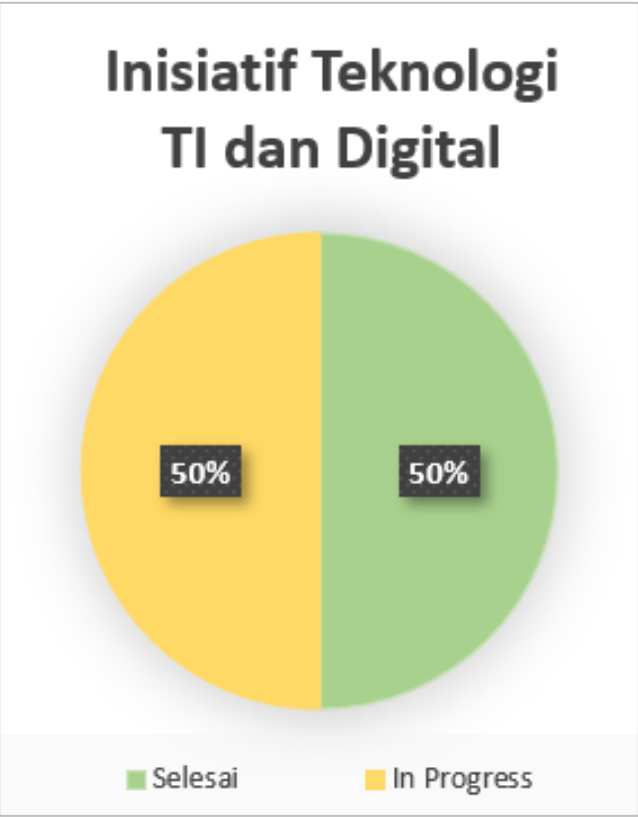

**Terdapat Roadmap Pengembangan
2 Portofolio Inisiatif Teknologi TI dan Digital**

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Selesai (1 Inisiatif Teknologi TI dan Digital)						In Progress (1 Inisiatif Teknologi TI dan Digital)					
B.2.1.2 Inventarisasi terhadap legacy system dan Non legacy system pada Stream TI dengan Stream Digital						B.2.1.1 Pemetaan kebutuhan data, integrasi data, dan peta akses aplikasi yang saling berhubungan antara Stream TI dengan Stream Digital sesuai dengan kebutuhan bisnis PERURI					

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI & DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Integrasi Aplikasi dan Data	B.2.1.1	Pemetaan kebutuhan data, integrasi data, dan peta akses aplikasi yang saling berhubungan antara Stream TI dengan Stream Digital sesuai dengan kebutuhan bisnis PERURI	Latar Belakang : Saat ini data menjadi aset strategis utama dalam pengambilan keputusan bisnis, inovasi layanan, dan efisiensi operasional. Oleh karena itu sinkronisasi antara Stream TI dan Stream Digital sangat penting agar sistem dan aplikasi yang dibangun benar benar mendukung tujuan bisnis Prasyarat : - Dibentuknya tim lintas fungsi antara Stream TI dengan Stream Digital untuk mendukung kolaborasi Integrasi Aplikasi dan Data - Dokumen proses bisnis (Business Process Mapping) Kebutuhan data spesifik untuk analitik, operasional, atau layanan digital - Terdapat data inventory atau data katalog - Dokumen kebijakan hak akses berbasis peran atau Role-Based Access Control (RBAC)	- Stream TI - Stream Digital	EA Tools	In Progress	FGD pembahasan probis produk Digital dengan Digital dan BPPM

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI & DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Terdapat tools monitoring dan logging untuk akses dan alur data - Harus disepakati standar kualitas dan format data Luaran : - Dokumen kebutuhan data bisnis yang menjelaskan data apa saja yang dibutuhkan oleh Stream TI dan Stream digital untuk menjalankan proses, analitik, dan pengambilan Keputusan - Mapping data ke proses bisnis untuk menyelaraskan jenis data dengan aktivitas bisnis yang spesifik - Arsitektur integrasi data, berupa diagram teknis yang menggambarkan bagaimana data mengalir antar system - Skema integrasi antar system dengan standar format data, protokol komunikasi, dan middleware yang digunakan untuk mencegah silo data dan redundansi Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI & DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Integrasi Aplikasi dan Data	B.2.1.2	Inventarisasi terhadap legacy system dan Non legacy system pada Stream TI dengan Stream Digital	Latar Belakang : - Kondisi saat ini Stream TI dalam menjalankan komputasi infrastruktur sebagian besar menggunakan perangkat Nutanix dimana virtualisasi server yang digunakan adalah VM Nutanix. Sedangkan pada Stream Digital menggunakan virtualisasi server VM Ware maka agar sistem yang dijalankan dapat beroperasi maksimal, maka perlu dilakukan inventarisasi terhadap legacy system dan Non legacy system - Legacy system adalah system yang membutuhkan environment Windows terutama untuk Windows versi lama (bukan versi terbaru), termasuk SAP certified OS, lisensi dan perangkat keras yang berhubungan erat dengan versi windows - Non Legacy system adalah sistem yang menggunakan OS Linux, Container, dan Kubernetes dengan memiliki kemampuan Autoscaling. Maka untuk Aplikasi yang membutuhkan Autoscaling, performa terbaik didapatkan pada perangkat Nutanix karena desain dari system Nutanix yang mampu memberikan kemampuan komputasi dan performa terbaik	- Stream TI - Stream Digital	Aset Management	Selesai	Data aset telah tercatat di aplikasi Sihepi. Sistem operasi legacy memungkinkan untuk diupgrade mengikuti perubahan versi pada aplikasi

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI TI & DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)


Persentase
Project Selesai

50%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			Prasyarat : - Dokumen inventarisasi seluruh perangkat server aplikasi dan klasifikasi OS nya Luaran : - Merinci seluruh sistem yang dikelola atau digunakan oleh organisasi - Peta ketergantungan antar sistem, sistem mana yang bergantung pada legacy - Timeline prioritas migrasi Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

Portofolio Inisiatif Teknologi Digital

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

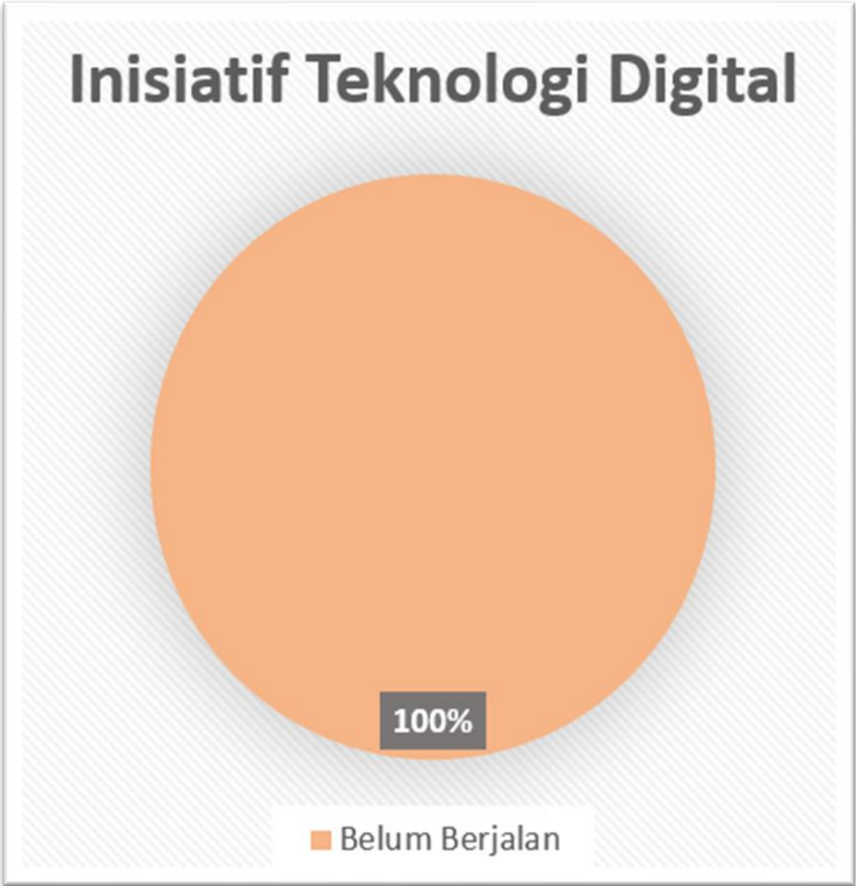

Terdapat Roadmap Pengembangan 6 Portofolio Inisiatif Teknologi Digital

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des

Belum Berjalan (6 Inisiatif Teknologi Digital)

- B.3.2.1 Penerapan CISCO ACI Architecture Pada Jaringan LAN
- B.3.2.2 Penambahan Kapasitas Bandwidth Pada LAN sesuai dengan kebutuhan
- B.3.2.3 Penambahan Kapasitas Bandwidth untuk interkoneksi antara DC ke DRC
- B.3.4.3 Penerapan Network sec sandboxing
- B.3.4.5 Penerapan secure coding dan pengujian kerentanan pada Aplikasi
- B.3.4.8 Implementasi tools Zero Trust access

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Performa dan interkoneksi Jaringan	B.3.2.1	Penerapan CISCO ACI Architecture Pada Jaringan LAN	Ruang Lingkup : Saat ini Data Center dan Data Recovery Center pada Stream Digital telah menerapkan CISCO ACI Architecture maka agar terdapat Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) dapat terintegrasi ke dalam infrastruktur jaringan lokal dimana untuk membangun jaringan yang otomatis, terpusat, fleksibel, dan lebih aman, maka direkomendasikan agar diterapkan CISCO ACI Architecture Pada Jaringan LAN Stream Digital yang mencakup aspek teknis, fungsional, dan operasional Prasyarat : • Terdapat perangkat Application Centric Infrastructure (ACI) Cisco Nexus 9000 Series Switches • Terdapat Cisco APIC (Application Policy Infrastructure Controller) Controllers dengan minimal 3 node untuk high availability • Topologi Harus siap untuk diubah menjadi spine-leaf topologi, bukan lagi model core-distribution-access	• Planning and Architecture Departement • Operation and Security Departement		Belum Berjalan	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Minimal tim harus memahami Konsep SDN dan ACI - Perlu perencanaan awal tentang segmentasi jaringan - Terdapat Lisensi Cisco ACI sesuai kapasitas Luaran : - Terbentuknya topologi Spine-Leaf yang menggantikan model core-distributionaccess tradisional - Semua perangkat endpoint seperti server , access switch, firewall, dll berhasil terhubung ke leaf switch - Cisco ACI fabric berhasil dikonfigurasi dan berjalan stabil - Implementasi microsegmentation untuk endpoint sensitive - Monitoring perangkat dan status kesehatan jaringan (health score) - Pengaturan jaringan tidak lagi dilakukan manual per switch Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Performa dan interkoneksi Jaringan	B.3.2.2	Penambahan Kapasitas Bandwidth Pada LAN sesuai dengan kebutuhan	Ruang Lingkup : - Peningkatan bandwidth pada jaringan LAN (Local Area Network) merupakan proses pengembangan infrastruktur jaringan untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas data, memperbaiki performa dan menghindari bottleneck agar LAN tetap efisien, handal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna - Melakukan pengujian untuk memastikan peningkatan bandwidth pada LAN tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan Prasyarat : - Melakukan assesment Network capacity planning dengan melakukan analisa trafik data dengan cara mengukur penggunaan trafik usage data serta melakukan Identifikasi bottleneck di-titik mana terdapat keterbatasan bandwidth uplink, switch, endpoint - Memperkirakan kebutuhan bandwidth ke depan dengan menghitung Jumlah user, Aplikasi yang digunakan (VoIP, video conference, cloud, CCTV IP, dll), Kebutuhan transfer data besar	- Planning and Architecture Departement - Operation and Security Departement		Belum Berjalan	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			Luaran : Menentukan kapasitas bandwidth yang diperlukan berdasarkan pertumbuhan penggunaan data dalam periode tertentu Tahun: 2026 (Q3-Q4)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Performa dan interkoneksi Jaringan	B.3.2.3	Penambahan Kapasitas Bandwidth untuk interkoneksi antara DC ke DRC	Ruang Lingkup : - Peningkatan bandwidth dan adopsi teknologi terbaru untuk koneksi antara Data Center Surabaya dan DRC Sentul - Untuk memastikan redundansi, ketersediaan, dan keandalan jaringan, dan menghindari bottleneck pada saat transfer data atau akses aplikasi yang disebabkan oleh kapasitas bandwidth yang terbatas. Maka diperlukan adaptasi teknologi terbaru untuk meningkatkan bandwidth sesuai kebutuhan. - Melakukan pengujian untuk memastikan peningkatan bandwidth tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan Prasyarat : - Melakukan assesment Network capacity planning dengan melakukan analisa trafik data dengan cara mengukur penggunaan trafik data dari Data Center ke Data Recovery Center saat ini untuk memahami pola trafik dan kebutuhan bandwidth yang ada - Melakukan Analisis kinerja jaringan link saat ini - Melakukan Identifikasi aplikasi yang berjalan di atas jaringan dan tingkat sensitivitas terhadap latensi atau delay	- Planning and Architecture Departement - Operation and Security Departement		Belum Berjalan	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Melakukan analisis terhadap infrastruktur yang sudah ada, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, serta batasan teknologi yang ada - Menentukan kapasitas bandwidth yang diperlukan berdasarkan pertumbuhan penggunaan data dalam periode tertentu Luaran : - Rencana peningkatan kapasitas bandwidth dari yang diperlukan untuk Koneksi antara Data Center Surabaya dan Data Recovery Center Sentul - Pemilihan teknologi dan perangkat keras yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bandwidth - Penilaian kelebihan dan kekurangan dari teknologi terbaru yang akan diadopsi Tahun: 2026 (Q1-Q2)				

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Cybersecurity Tools	B.3.4.3	Penerapan Network sec sandboxing	Latar Belakang : Saat ini ancaman siber terus berkembang dengan cepat baik dari sisi volume, variasi maupun tingkat kecanggihannya. Serangan seperti malware polymorphic, ransomware, fileless attack, dan Advanced Persistent Threats (APT) sering kali tidak terdeteksi oleh sistem keamanan tradisional seperti antivirus dan firewall biasa. Untuk menjawab tantangan ini, organisasi perlu menggunakan solusi keamanan yang lebih proaktif, adaptif, serta berbasis analisis mendalam salah satunya adalah sandboxing tools di jaringan Prasyarat : - Identifikasi ancaman yang ingin dicegah - Jaringan harus mendukung penyisipan sandbox appliance - Bandwidth dan kapasitas jaringan memadai untuk menangani trafik dari atau ke sandbox Luaran : - Sandboxing mampu mendeteksi malware yang tidak memiliki signature termasuk zero-day attack dan APT Advanced Persistent Threats - File atau trafik yang mengandung malware langsung diblokir berdasarkan hasil sandbox Tahun: 2026 (Q1-Q4)	- Planning and Architecture Departement - Operation and Security Departement		Belum Berjalan	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Cybersecurity Tools	B.3.4.5	Penerapan secure coding dan pengujian kerentanan pada Aplikasi	Latar Belakang : Untuk mencegah kerentanan keamanan atau vulnerabilities system dengan mengurangi jumlah bug dan kerentanan dalam aplikasi seperti SQL injection, XSS, buffer overflow, CSRF dan lain sebagainya perlu penerapan secure coding dan pengujian kerentanan Aplikasi Prasyarat : • Penetapan dan sosialisasi standar coding aman • Developer perlu mendapatkan pelatihan secure coding • Aplikasi harus bisa dijalankan di environment pengujian (testing/staging) tidak boleh hanya tersedia di produksi • Tools Pengujian kerentanan yang sesuai Luaran : • Penurunan jumlah kerentanan aplikasi • Standar dan pedoman coding aman dan terdokumentasi Tahun: 2026 (Q2-Q3)	• Planning and Architecture Departement • Operation and Security Departement		Belum Berjalan	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
Optimalisasi Cybersecurity Tools	B.3.4.8	Implementasi tools Zero Trust access	Latar Belakang : Implementasi Zero Trust access dimana menekankan bahwa semua akses ke sumber daya baik itu jaringan, aplikasi atau data harus divalidasi sebelum diberikan akses, dengan sama sekali tidak mempercayai orang yang akan mengakses berdasarkan lokasi atau status jaringan Prasyarat : - Melakukan Identifikasi sumber daya kritikal yang perlu dilindungi - Menyusun peta alur akses pengguna dan perangkat yang akan diimplementasikan dalam model Zero Trust - Penilaian alat dan solusi Zero Trust dengan melakukan POC - Menentukan teknologi otentikasi multifaktor (MFA), Identity and Access Management (IAM), Network Segmentation, dan Micro-Segmentation yang akan digunakan dalam arsitektur Zero Trust Luaran : - Pemilihan perangkat Zero Trust sesuai dengan kebutuhan organisasi	- Planning and Architecture Departement - Operation and Security Departement		Belum Berjalan	

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TEKNOLOGI DIGITAL

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai


0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Nama Teknologi	Status	Keterangan
			- Menyusun arsitektur Zero Trust yang meliputi berbagai komponen, seperti identitas pengguna, perangkat, aplikasi, dan data yang akan diakses - Penyusunan protokol akses dan otentikasi untuk setiap titik akses, termasuk penggunaan MFA dan single sign-on (SSO) - Penentuan micro-segmentation untuk membatasi akses berdasarkan kebijakan keamanan yang ditentukan misalnya, membatasi komunikasi antar aplikasi yang tidak terkait - Pengujian fungsi autentikasi dan otorisasi untuk memastikan bahwa proses Zero Trust berjalan sesuai yang diinginkan misalnya, setiap permintaan akses harus melewati autentikasi, otorisasi dan pemantauan - Mengintegrasikan alat SIEM (Security Information and Event Management) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai titik akses Tahun: 2026 (Q1-Q4)				

Portofolio Inisiatif Tata Kelola TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Inisiatif Tata Kelola TI

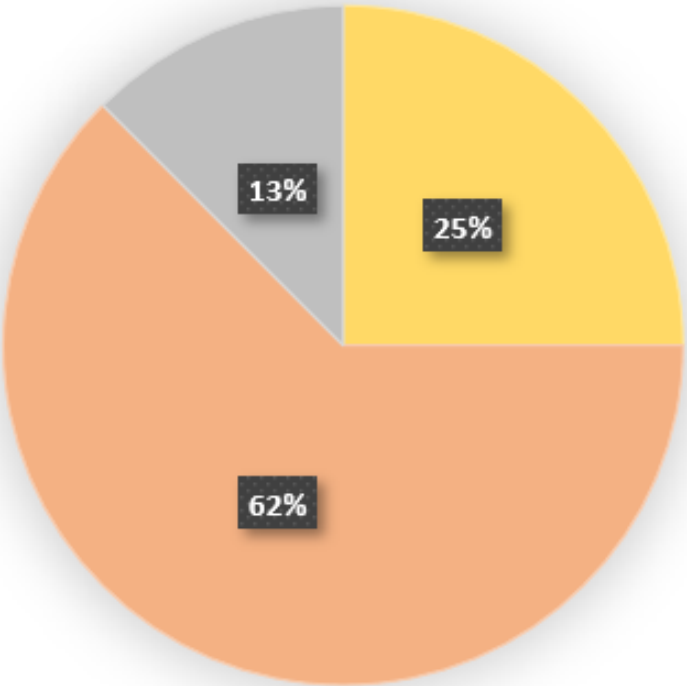

■ In Progress ■ Belum Berjalan ■ Drop

Terdapat Roadmap Pengembangan
8 Portofolio Inisiatif Tata Kelola TI

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des

In Progress (2 Inisiatif Tata Kelola TI)

- C.2.2 Perbaikan prosedur & panduan tahap 1
- C.2.5 Peningkatan kompetensi SDM TI

Drop (1 Inisiatif Tata Kelola TI)

- C.3.2 Recertification atau Surveillance ISO 20000

Belum Berjalan (5 Inisiatif Tata Kelola TI)

- C.1.4 Pembaruan atau Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Data Tahap 2
- C.2.1 Pembentukan CISO Office
- C.3.1 Recertification atau Surveillance ISO 27001
- C.3.3 Recertification atau Surveillance ISO 14298
- C.3.4 Peningkatan standar sesuai kebutuhan Perum Peruri

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TATA KELOLA TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Status	Keterangan
Implementasi Framework Tata Kelola Data	C.1.4	Pembaruan atau Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Data Tahap 2	Ruang Lingkup : Penyusunan Draft Kebijakan Tata Kelola Data Tahap 2 yang meliputi: - Prosedur atau panduan menjaga kualitas data - Review dan penguatan kebijakan tata kelola data untuk data analytic dan data catalog Prasyarat : • Kebijakan Tata Kelola Data Tahap 1 Luaran : • Draft Kebijakan Tata Kelola Data Tahap 2 Tahun: 2026 (Q2 - Q3)	• Dept Perencanaan dan Arsitektur TI • DGO sebagai Dept Pengelolaan Data	Belum Berjalan	• Proses pengadaan Implementasi Data Governance

Legend

Selesai

In Progress

Belum Berjalan

Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TATA KELOLA TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Status	Keterangan
Peningkatan Kematangan dan Kompetensi TI	C.2.1	Pembentukan CISO Office	Ruang Lingkup : Pembentukan CISO Office sebagai divisi atau departemen pada Struktur Organisasi dengan Perencanaan dan Tata Kelola Keamanan TI dan Operasional Keamanan TI (SOC) Prasyarat : - Luaran : • SKEP Departemen atau Divisi Pengelolaan Keamanan TI atau CISO Office Tahun: 2026 (Q2 - Q3)	Dept Perencanaan dan Arsitektur TI	Belum Berjalan	

Legend



Selesai



In Progress



Belum Berjalan



Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TATA KELOLA TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Status	Keterangan
Peningkatan Kematangan dan Kompetensi TI	C.2.2	Perbaiki prosedur & panduan tahap 1	Ruang Lingkup : Asesment IT maturity berbasis COBIT2019 Perbaiki atau pembaruan prosedur dan panduan proses prioritas untuk mencapai tingkat kematangan 3 COBIT 2019. Lingkup proses adalah sebagai berikut: - Pengelolaan data (APO14) - Pengelolaan keamanan siber dan informasi - Pengelolaan identifikasi solusi (BAI03) Prasyarat : • Hasil penilaian COBIT 2019 Luaran : • Prosedur atau panduan terbaru Tahun: 2026 (Q2 - Q3)	• Dept Perencanaan dan Arsitektur TI	In Progress	• Pembahasan SOP terkait Data • Revisi SOP Pengembangan Solusi TI ke BPPM

Legend

Selesai

In Progress

Belum Berjalan

Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TATA KELOLA TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Status	Keterangan
Peningkatan Kematangan dan Kompetensi TI	C.2.5	Peningkatan kompetensi SDM TI	Ruang Lingkup : Peningkatan kompetensi SDM TI berdasarkan program digital talent BUMN melalui pelatihan dan sertifikasi untuk mendukung transformasi digital dan tata kelola TI yang berkualitas dari sisi sumber daya manusia. Inisiatif ini juga mendukung implementasi INDI 4.0 pada pilar Orang dan Budaya untuk bidang Pengembangan Kompetensi Prasyarat : - Luaran : • Sertifikasi SDM Tahun: 2025 - 2029 (Q2 - Q3)	Divisi TI	In Progress	IT Security : CEH EJPT ISO 27001 Foundation BSCP

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TATA KELOLA TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Status	Keterangan
Pembaruan dan Peningkatan Standar TI 2025 - 2029	C.3.1	Recertification atau Surveillance ISO 27001	Ruang Lingkup: Pembaruan atau audit pemeliharaan sertifikasi ISO 27001 yang sudah dimiliki Perum Peruri Prasyarat: - Kajian Sertifikasi ISO 27001 (laporan surveillance) Luaran: - Hasil sertifikasi Tahun: 2025 - 2029 (Q2 - Q4)	Dept. Perencanaan TI sebagai pendamping dengan unit terkait ISO.27001	Belum Berjalan	Pengajuan pengadaan Pekerjaan Surveillance I

Legend

Selesai

In Progress

Belum Berjalan

Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TATA KELOLA TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Status	Keterangan
Pembaruan dan Peningkatan Standar TI 2025 - 2029	C.3.2	Recertification atau Surveillance ISO 20000	Ruang Lingkup: Pembaruan atau audit pemeliharaan sertifikasi ISO 20000 yang sudah dimiliki Perum Peruri Prasyarat : - Kajian Sertifikasi ISO 20000 (laporan surveillance) Luaran: - Hasil sertifikasi 20000 Tahun: 2025 - 2029 (Q2 - Q4)	Dept. Perencanaan TI sebagai pendamping dengan unit terkait ISO	Drop	Saat ini Divisi TI hanya implementasi layanan yang terpenuhi dalam SLA

Legend

Selesai

In Progress

Belum Berjalan

Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TATA KELOLA TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Status	Keterangan
Pembaruan dan Peningkatan Standar TI 2025 - 2029	C.3.3	Recertification atau Surveillance ISO 14298	Ruang Lingkup: Pembaruan atau audit pemeliharaan sertifikasi ISO 14298 yang sudah dimiliki Perum Peruri Prasyarat : - Kajian Sertifikasi ISO 14298 Luaran: - Hasil sertifikasi Tahun: 2025 - 2029 (Q2 - Q4)	Dept. Perencanaan TI sebagai pendamping dengan unit terkait ISO 14298	Belum Berjalan	

Legend

Selesai

In Progress

Belum Berjalan

Drop

DETAIL PORTOFOLIO INISIATIF TATA KELOLA TI

(LAPORAN MONITORING TRIWULAN II TAHUN 2026)

Persentase
Project Selesai

0%

Sub Program	No. Indikator	Nama Sub Program	Detail Sub Program	Pelaksana	Status	Keterangan
Pembaruan dan Peningkatan Standar TI 2025 - 2029	C.3.4	Peningkatan standar sesuai kebutuhan Perum Peruri	Ruang Lingkup: Peningkatan standar yang berkaitan dengan TI untuk mendukung efisiensi, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi atau sesuai kebutuhan Perum Peruri beberapa diantaranya adalah: - ISO 22301 Manajemen Keberlangsungan Bisnis - ISO 31000 Manajemen Risiko - ISO 29100 Privasi dan Perlindungan Data - ISO 22320 Manajemen Insiden - ISO 12207 Proses Rekayasa Perangkat Lunak Prasyarat : - Luaran: • Hasil sertifikasi Tahun: 2025 - 2029 (Q2 - Q4)	• Dept. Perencanaan TI	Belum Berjalan	- ISO 9001 - ISO 28000

Legend	Selesai	In Progress	Belum Berjalan	Drop
---------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	------------------

TERIMA KASIH
